PROJEKTPLAN

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Titel	JL Physio – Digitaler Übungsbegleiter
Kurzbeschreibung	Web-basierte, zweiseitige Physiotherapie-Anwendung • *Therapeutin:* Erstellung individueller Übungspläne, Verwaltung des Übungskatalogs & Patient:innen-Verwaltung • *Patient:innen:* Individuell angepasste, geführte Home-Trainings
Laufzeit	Beginn: 01.09.2026 Abschluss: 26.02.2027
Auftraggeberin	Jasmin Lacher, BSc. (Selbstständige Physiotherapeutin)
Auftragnehmerin	Natalie Marie Neumayer

Inhalt

1. Einleitung & Kurzbeschreibung 2
2. Ausgangssituation & Motivation 2
3. Fragestellung 2
4. Projektziele 3
   4.1. Teilziel: Entwicklung der Therapeut:innen-Ansicht 3
   4.2. Teilziel: Entwicklung der Patient:innen-Ansicht 3
   4.3. Teilziel: Qualitätssicherung & Rollout 3
5. Projektnutzen 4
6. Zielgruppenbeschreibung 4
   6.1. Zielgruppe A – Therapeutin (Auftraggeberin) 4
   6.2. Zielgruppe B – Patient:in 5
7. Abgrenzungen & Nicht-Ziele 5
8. Ressourcen und Aufwand 6
9. Arbeitspakete 6
   9.1. Übersicht 6
   9.2. Detaillierter Arbeitsplan 7
10. Projektstrukturplan 11
11. Meilensteine 12
12. Deliverables 14
13. Gantt-Chart 15
14. Risikoanalyse 16

Versionierung				
Nr.	**Datum**	**Version**	**Geänderte Kapitel**	**Art der Änderung**
1	04.11.2026	1.1.	Arbeitspakete	Erstellung
2	06.11.2026	1.2.	Meilensteine; Deliverables	Erstellung
3	08.11.2026	1.3.	Einleitung & Kurzbeschreibung; Ausgangssituation & Motivation; Fragestellung; Projektziele; Projektnutzen; Zielgruppenbeschreibung; Abgrenzungen & Nicht-Ziele;	Erstellung
4	09.11.2026	1.4.	Ressourcen & Aufwand; Risikoanalyse	Erstellung
5	11.11.2026	1.5.	Projektstrukturplan; Gantt-Chart	Erstellung
6	12.11.2026	1.6.	Alle	Überarbeitung

1. Einleitung & Kurzbeschreibung

Der Kern des Projekts ist die Erarbeitung und Erstellung einer zweiseitigen, responsiven Web-Application („JL Physio – Digitaler Übungsbegleiter“) in Zusammenarbeit mit einer selbstständigen Physiotherapeutin (Jasmin Lacher, BSc.). Der Projektzeitraum ist von September bis Februar definiert.

Der Zweck des Projekts ist es, dass meine Auftraggeberin ihre Patient:innen besser unterstützen und auf deren individuelle Bedürfnisse so gut wie möglich eingehen kann. Die Anwendung soll sie bei der Verwaltung von Übungsplänen unterstützen und dadurch ihren Praxisalltag effizienter machen. Zusätzlich soll den Patient:innen ein gestütztes Setting im Home-Training geboten werden.

2. Ausgangssituation & Motivation

Meine Auftraggeberin leitet ihre eigene Physiotherapiepraxis. Für den Therapieerfolg der Patient:innen ist es langfristig notwendig, Übungen zusätzlich in der Freizeit regelmäßig und richtig durchzuführen.

Der Prozess der Übungsplanerstellung und -weitergabe führt momentan zu einem großen organisatorischen Aufwand. Weiters fehlt ein digitales Tool, das Patient:innen zuhause beim Training unterstützt. Die Motivation für dieses Projekt liegt darin, den Betreuungsprozess weiter zu digitalisieren, den Praxisalltag einfacher zu machen und zusätzlich den Patient:innen eine praktische Hilfe für das Home-Training zu bieten. Der Kern des Projekts ist, bewährte Usability-Konzepte in Zusammenarbeit mit den zwei User-Gruppen zu integrieren und die kognitive Belastung auf ein Minimum zu reduzieren.

3. Fragestellung

Wie kann/muss eine zweiseitige, webbasierte Physiotherapie-Anwendung bedürfnisorientiert geplant und entwickelt werden, um den Praxis-Workflow der Therapeutin zu vereinfachen und Patient:innen beim Home-Training zu unterstützen, ohne deren kognitive Belastung zu erhöhen?

4. Projektziele

Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, den Praxisalltag von Jasmin Lacher und die Home-Trainings der Patient:innen einfacher und effizienter zu gestalten. Dies wird durch die Erreichung der nachstehenden Teilziele erzielt.

4.1. Teilziel: Entwicklung der Therapeut:innen-Ansicht

beinhaltet:

- die Implementierung einer sicheren Login-Struktur mit Möglichkeit zur Passwortänderung
- die Entwicklung einer Admin-Ansicht für Jasmin, welche die Erfassung und Verwaltung von Patient:innen-Profilen, u. a. für den automatischen Versand der Registrierungslinks, außerhalb von Supabase ermöglicht
- die Erstellung aller notwendigen Formulare für die Wartung des Übungskatalogs, inkl. der Möglichkeit, Bildanleitungen hochzuladen und die Übungen nach Körperregionen zu taggen
- die Einarbeitung eines Formulars zur Erstellung und Bearbeitung individueller Übungspläne für registrierte Patient:innen, inkl. einer PDF-Exportfunktion für die praxisinterne Ablage
- die Implementierung einer PDF-Exportfunktion für die Übergabe von Übungsplänen an nicht-registrierte bzw. technikferne Patient:innen

4.2. Teilziel: Entwicklung der Patient:innen-Ansicht

beinhaltet:

- die Implementierung einer sicheren Login-Struktur mit Möglichkeit zur Passwortänderung
- die Erstellung einer übersichtlichen Startseite mit einer übersichtlichen Anzeige des Tagesplans sowie des täglichen Trainingsfortschritts
- die Umsetzung eines unterstützenden und führenden Trainingsmodus mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und allen wichtigen Informationen zur sicheren Durchführung der Übungen (Sätze, Wiederholungen, Pausen, Gewichte, Häufigkeit, Hilfsmittel, Richtlinien, etc.)

4.3. Teilziel: Qualitätssicherung & Rollout

beinhaltet:

- die Umsetzung und Analyse der drei Usability- bzw. UX-Tests und -befragungen (Fragenbogen zum Canva-Prototyp, Usability-Test der Beta-Version mit Befragung, Usability Test der fertigen Anwendung mit SUS-Fragebogen)
- das erfolgreiche Go-Live auf Netlify (Frontend) und Supabase (Backend) sowie finale Übergabe der Anwendung an Jasmin Lacher bis Mitte Februar 2027

5. Projektnutzen

Für die Therapeutin bringt das Programm eine bessere Übersicht und eine erhebliche Zeitersparnis mit sich, besonders bei der Erstellung und Bearbeitung von Übungsplänen. Zudem kann sie auf die individuellen Bedürfnisse der Patient:innen besser eingehen und wird in den dazugehörigen Abläufen flexibler.

Die Patient:innen starten motivierter in ihre Trainings und bekommen zusätzliche Unterstützung bei der Ausführung der Übungen, ohne sich gänzlich auf ihr Gedächtnis oder unübersichtliche Blätter verlassen zu müssen. Ihr Home-Training wird durch aussagekräftige Bildanleitungen und Hinweise einfacher. Zusätzlich können sie ihre Trainings via Smartphone von überall aus durchführen, solange eine Internetverbindung besteht.

6. Zielgruppenbeschreibung

Das System ist für zwei primäre Zielgruppen ausgelegt. Diese werden untenstehend anhand der entwickelten Personas vereinfacht zusammengefasst.

6.1. Zielgruppe A – Therapeutin (Auftraggeberin)

- ***Name und Alter:*** Jasmin L., 27 Jahre, selbstständige Physiotherapeutin
- ***Technikaffinität:*** Hoch, nutzt sowohl privat als auch beruflich moderne Anwendungen
- ***Ziele:*** Rasche und unkomplizierte Erstellung von individuellen Übungsplänen für ihre Patient:innen, Feedback von Patient:innen zu den Übungen im Blick behalten, um diesen Unterstützung zu bieten
- ***Pain Points:*** Zeitaufwand und -mangel, manuelle Erstellung von Handouts
- ***Zitat:*** „Ich brauche ein Programm, mit dem ich in wenigen Minuten einen passenden Übungsplan für meine Patient:innen erstellen kann."

6.2. Zielgruppe B – Patient:in

- ***Name und Alter**:* Mark T., 56 Jahre, Sachbearbeiter mit Rückenschmerzen
- ***Technikaffinität:*** Mittelmäßig, nutzt alltägliche Anwendungen wie Whatsapp und Outlook und findet sich in verschachtelten Anwendungen nicht zurecht
- ***Ziele:*** Schmerzfreiheit, Berücksichtigung seiner individuellen Probleme und Präferenzen, einfaches Guiding durch seine täglichen Übungen
- ***Pain Points:*** Alleinige richtige Ausführung der Übungen bereitet ihm Probleme, Unsicherheit bei Schmerzen
- ***Zitat:*** „Ich möchte meine täglichen Übungen im Blick behalten und richtig durchführen können."

7. Abgrenzungen & Nicht-Ziele

Um den Projektrahmen klar zu definieren und zu schützen sowie ein fristgerechtes Go-Live zu garantieren, werden folgende Aspekte explizit aus dem Leistungsumfang des Minimum Viable Product ausgeschlossen.

- **Keine Feedbackfunktion im MVP:** Obwohl im Prototyp die Elemente für eine mögliche Feedback-Funktion integriert sind, ist die Implementierung der Funktion nicht Teil des Projekts. Die Erweiterung der Anwendung kann im Rahmen einer zukünftigen Zusammenarbeit stattfinden.
- **Kein App-Download:** Die Application wird nur als Web-App (HTML, CSS, JS, Supabase) entwickelt. Sie wird nicht zum Download bereitstehen.
- **Keine Videoanleitungen:** Die Integration von Videoanleitungen ist trotz Vorteil für die Usability nicht Teil des Projekts. Im Rahmen des MVP liegt der Fokus auf den Bildanleitungen. Eine solche Funktion kann ebenso zukünftig ergänzt werden, bedarf allerdings zusätzlicher Informations- und Entwicklungsarbeit sowie einem kostenpflichtigen Datenbank-Abo.
- **Keine Anbindung an externe Systeme:** Die Software dient nur der Übungsbegleitung und der damit einhergehenden Patientenverwaltung. Sie verfügt über eine eigenständige Infrastruktur und ist nicht in externe Systeme integrierbar.
- **Keine Übergabe der Infrastruktur:** Im Rahmen des Projekts ist lediglich die zeitlich unbegrenzte und kostenlose Übergabe des Nutzungsrechts für das MVP an die Auftraggeberin vereinbart. Der Zugang zum Code, zur Datenbank-Struktur und zu den Cloud-Anbietern werden nicht übergeben und bleibt bei mir als Entwicklerin.

8. Ressourcen und Aufwand

Ressourcen
Personalaufwand & Projektbudget
300 Stunden (12 ECTS) in Einzelarbeit
Erforderliche Kompetenzen
• Projektmanagement-Kenntnisse • Kernkompetenzen in GitHub, Canva, VS Code, Supabase & Netlify • HTML, CSS, JS, PostgreSQL • Usability-Kenntnisse • Wissenschaftliche Kompetenz

9. Arbeitspakete

9.1. Übersicht

AP	**Name**	**Laufzeit**
1	Projektmanagement & Rechtliches	01.09.2026 bis 26.02.2027
2	Requirements Engineering, Konzeption & Design	01.09.2026 bis 26.10.2026
3	Software-Entwicklung & System-Integration	03.11.2026 bis 12.02.2027
4	UX-Testing & Evaluierung	20.10.2026 bis 16.01.2027

9.2. Detaillierter Arbeitsplan

<table>
<tr><td>AP 1</td><td>Projektmanagement & Rechtliches
85 AS</td><td>01.09.2026 bis 26.02.2027</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ziele</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Zielgerichtete Steuerung der Projektabläufe
• Einhaltung der Fristen
• Rechtliche Absicherung der Zusammenarbeit
• Wissenschaftlich fundierte Durchführung, Dokumentation und Präsentation</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tasks</td></tr>
<tr><td colspan="2">Task 1.1.
Projektplanung & -steuerung
01.09.2026 bis 26.02.2027
25 AS</td><td>• Erste Abstimmung mit der Auftraggeberin zu Wünschen, Bedürfnissen & Zielen der Zusammenarbeit
• Laufende Koordination mit der Auftraggeberin
• Ausarbeitung des Projektplans</td></tr>
<tr><td colspan="2">Task 1.2.
Vertragswesen & Rechtliches
20.10.2026 bis 30.11.2026
10 AS</td><td>• Ausarbeitung und Unterzeichnung des Projektauftrags
• Erstellung, Besprechung und Unterzeichnung des Projekt- & Übergabevertrags</td></tr>
<tr><td colspan="2">Task 1.3.
Projektdokumentation & Berichtswesen
22.10.2026 bis 26.02.2027
50 AS</td><td>• Erstellung der Design-Spezifikation
• Vorbereitung und Durchführung des Pitch
• Ausarbeitung des Endberichts</td></tr>
<tr><td colspan="3">Meilensteine</td></tr>
<tr><td>MS 2</td><td colspan="2">Projektauftrag unterzeichnet (03.11.2026)</td></tr>
<tr><td>MS 3</td><td colspan="2">Abgabe Design-Spezifikation (06.11.2026)</td></tr>
<tr><td>MS 4</td><td colspan="2">Abgabe Projektplan (13.11.2026)</td></tr>
<tr><td>MS 5</td><td colspan="2">Projekt- und Übergabevertrag unterzeichnet (30.11.2026)</td></tr>
<tr><td>MS 9</td><td colspan="2">Durchführung des Pitch (27.01.2027)</td></tr>
<tr><td>MS 11</td><td colspan="2">Abgabe Endbericht & Projektabschluss (26.02.2027)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Deliverables</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unterzeichneter Projektauftrag</td></tr>
<tr><td colspan="3">Design-Spezifikation</td></tr>
<tr><td colspan="3">Projektplan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unterzeichneter Projekt- & Übergabevertrag</td></tr>
<tr><td colspan="3">Live Demo für den Pitch</td></tr>
<tr><td colspan="3">Endbericht</td></tr>
</table>

AP 2	**Requirements Engineering, Konzeption & Design 50 AS**	**01.09.2026 bis 26.10.2026**
Ziele		
• Analyse des Praxis-Workflows • Definition der nutzerzentrierten Anforderungen (Personas & Stories) • Festlegung des Brandings • Erstellung eines detaillierten Prototyps als essentielle Basis		
Tasks		
Task 2.1. Anforderung- & Bedürfnisermittlung 01.09.2026 bis 15.09.2026 10 AS	• Austausch mit der Therapeutin zu den Workflows und ihren Bedürfnissen sowie zu den Bedürfnissen der Patient:innen	
Task 2.2. Bedürfnisverarbeitung 20.09.2026 5 AS	• Erstellung der User Personas • Ausarbeitung der User Stories	
Task 2.3. Branding & UI Design 22.09.2026 5 AS	• Erstellung des Branding Boards (Styleguide) mit Berücksichtigung der Vorgaben der Auftraggeberin	
Task 2.4. Prototyping 26.09.2026 bis 26.10.2026 30 AS	• Ausarbeitung des zweiseitigen Prototyps für Therapeutin und Patient:innen in Canva	
Meilensteine		
MS 1	Fertigstellung Canva Prototyp (20.10.2026)	
Deliverables		
Konzeptidee		
User Personas & User Stories		
Branding Board (Styleguide)		
Canva Prototyp (zweiseitig)		

AP 3	**Software-Entwicklung & System-Integration 110 AS**	**03.11.2026 bis 12.02.2027**

Ziele
• Technische Umsetzung und Bereitstellung einer funktionsfähigen, responsiven Web-Application • Funktionsfähiges Zusammenspiel zwischen Frontend und Backend • Erfolgreiche Integration der sicheren Login-Funktion • Fristgerechtes Go-Live der funktionsfähigen Anwendung


Tasks	
Task 3.1. Frontend-Entwicklung 03.11.2026 bis 10.12.2026 55 AS	• Umsetzung der responsiven Therapeutin-UI mit HTML, CSS und JS • Umsetzung der responsiven Patient:innen-UI mit HTML, CSS und JS • Einbindung in das GitHub-Repository
Task 3.2. Backend & Datenbank 03.11.2026 bis 01.01.2027 40 AS	• Erstellung und Anbindung der PostgreSQL-Datenbank & des File Storage mittels Supabase • Verknüpfung mit GitHub
Task 3.3. Final Touches & Bugfixing 21.12.2026 bis 01.01.2027 10 AS	• Fehlerbehebung und Einarbeitung der Beta-Testergebnisse • Implementierung der Login-Funktion mittels Supabase Auth • Verknüpfung mit GitHub • Hosting via Netlify und Übertragung der IONOS-Domain
Task 3.4. Go-Live 01.02.2027 bis 12.02.2027 5 AS	• Freigabe für die Verwendung der Anwendung im Praxisbetrieb von Jasmin Lacher

Meilensteine	
MS 6	Fertigstellung Beta-Version und Beginn des Usability Testings (10.12.2026)
MS 7	Finalisierung der Anwendung (01.01.2027)
MS 10	Go-Live und Übergabe (12.02.2027)


Deliverables
Frontend-Quellcode (HTML, CSS, JS)
Eingerichtetes Supabase Backend (PostgreSQL-Datenbank, Storage, Auth)
Beta-Anwendung
Freigeschaltete Web-App

AP 4	**UX-Testing & Evaluierung 55 AS**	**20.10.2026 bis 16.01.2027**
Ziele		
• Iterative Prüfung der Ergebnisse und Qualitätssicherung • Mehrstufige Usability Tests mit den Zielpersonen • Wissenschaftlich fundierte Erfassung der System-Usability		
Tasks		
Task 4.1. Design-Feedback Phase 20.10.2026 bis 15.11.2026 10 AS	• Direktes Feedback der Therapeutin zum Prototyp und dessen Einarbeitung • Anonymes Patient:innen-Feedback via Google Forms und dessen Einarbeitung	
Task 4.2. Beta Test 11.12.2026 bis 20.12.2026 20 AS	• Usability Testing der Beta-Version (ohne Login-Funktion) mit 5 anonymen Test-Patient:innen und Therapeutin • Anschließende Befragung zur Beta-Version via Google Forms	
Task 4.3. Finale UX-Evaluierung 02.01.2027 bis 16.01.2027 25 AS	• Usability Testing der gesamten Anwendung (mit Login-Funktion) mit 5 anonymen Test-Patient:innen • Auswertung der System Usability mittels SUS-Fragebogen	
Meilensteine		
MS 8	Abschluss der UX-Evaluierung (16.01.2027)	
Deliverables		
Ausgewertete Google Forms Befragung zum Prototyp		
Ausgewertete Google Forms Befragung zum Beta-Programm		
Ausgewertete SUS-Fragebögen		

10. Projektstrukturplan

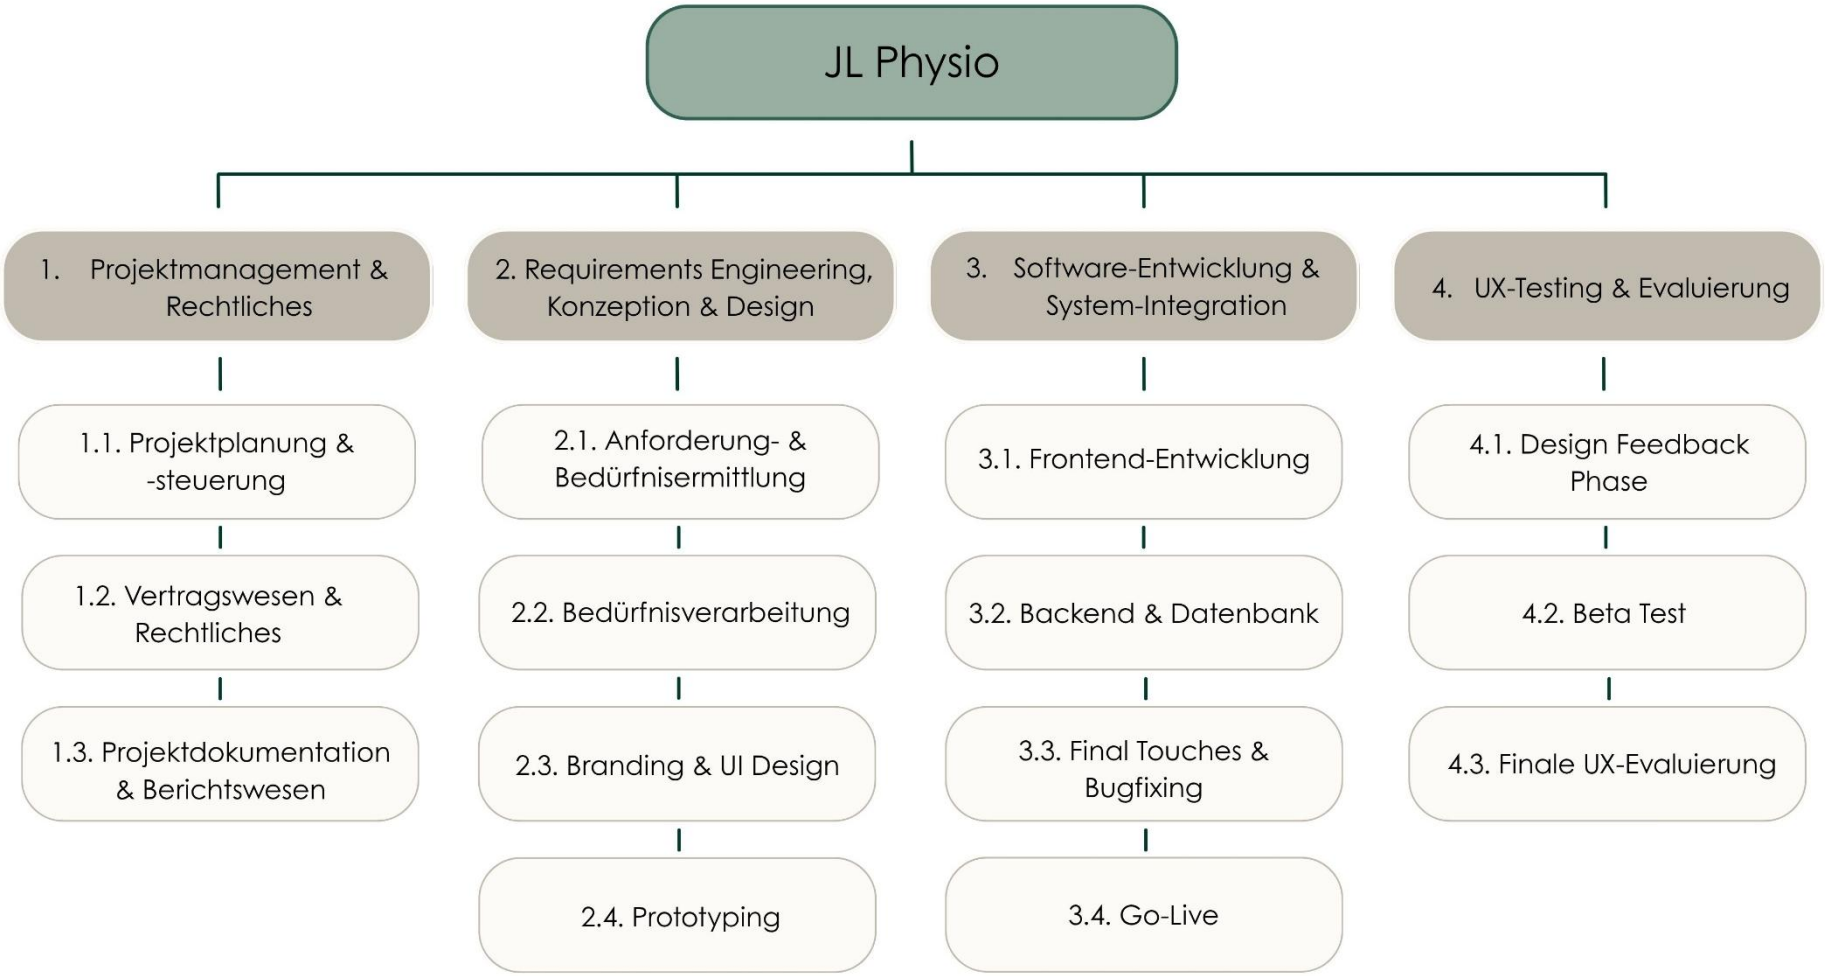

11. Meilensteine

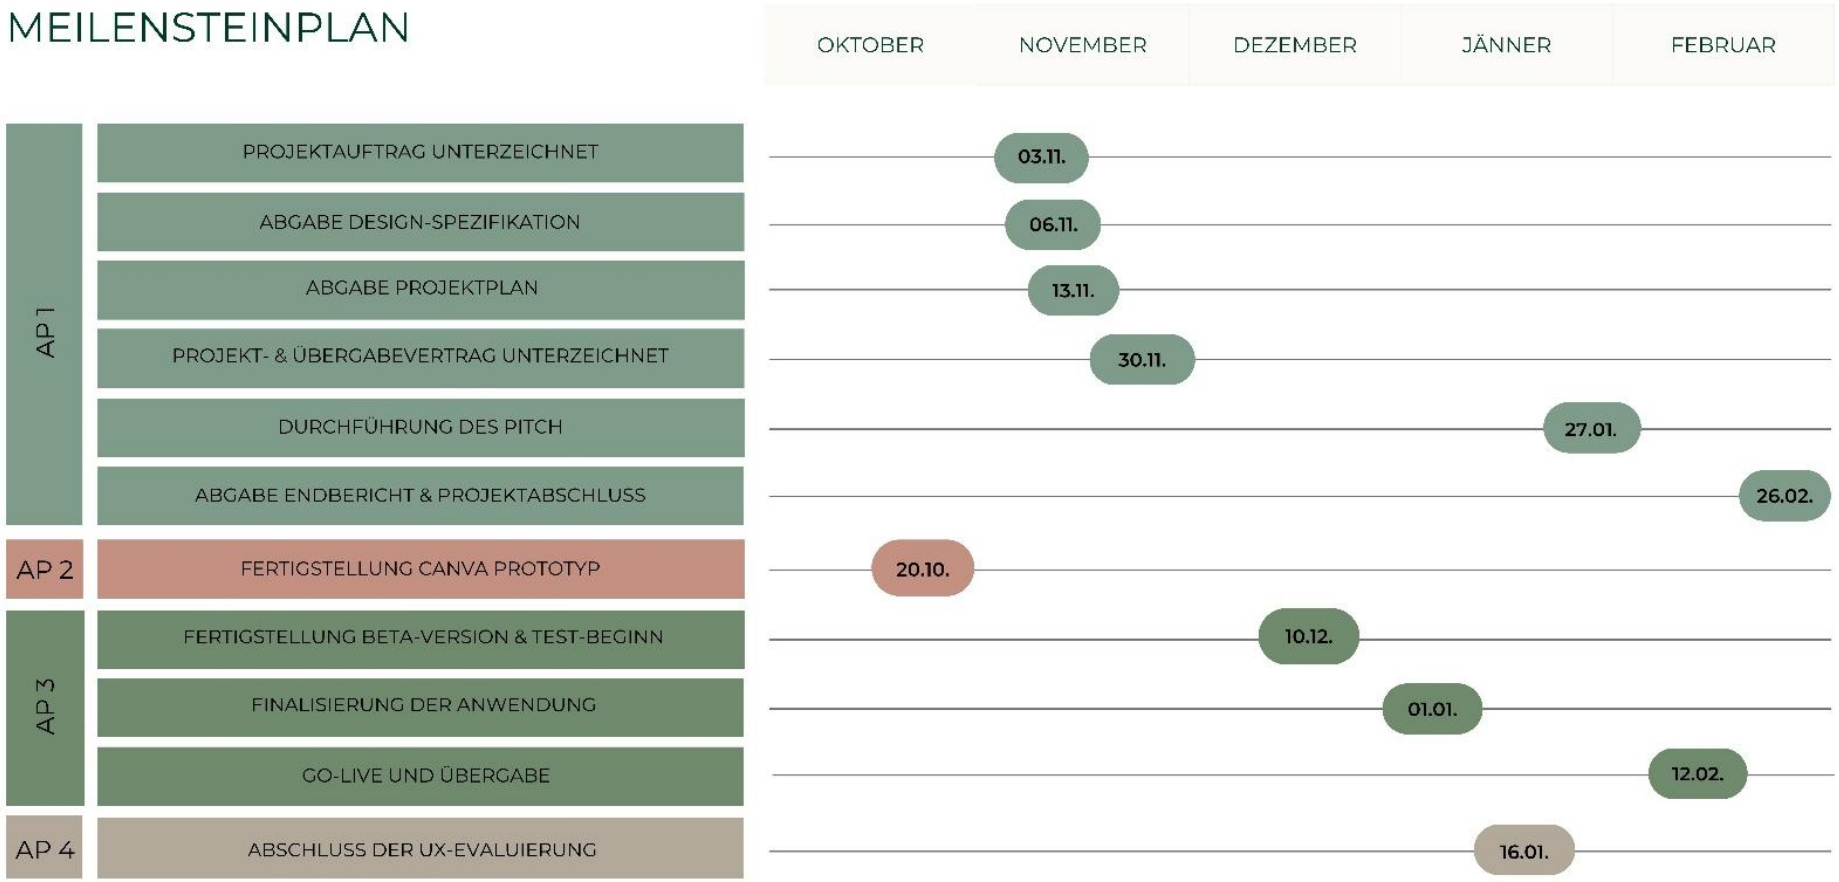


Stand	Nummer	Meilenstein	Fertigstellung
☒	**1**	Fertigstellung Canva Prototyp (20.10.2026)	20.10.2026
☒	**2**	Projektauftrag unterzeichnet	03.11.2026
☒	**3**	Abgabe Design-Spezifikation	06.11.2026
☒	**4**	Abgabe Projektplan	13.11.2026
☐	**5**	Projekt- und Übergabevertrag unterzeichnet	30.11.2026
☐	**6**	Fertigstellung Beta-Version und Beginn des Usability Testings	10.12.2026
☐	**7**	Finalisierung der Anwendung	01.01.2027
☐	**8**	Abschluss der UX-Evaluierung	16.01.2027
☐	**9**	Durchführung des Pitch	27.01.2027
☐	**10**	Go-Live und Übergabe	12.02.2027
☐	**11**	Abgabe Endbericht & Projektabschluss	26.02.2027

12. Deliverables

Stand	Deliverable	Fertigstellung
☒	Konzeptidee	17.09.2026
☒	User Personas & User Stories	22.09.2026
☒	Branding Board (Styleguide)	22.09.2026
☒	Canva Prototyp (zweiseitig)	20.10.2026
☒	Unterzeichneter Projektauftrag	03.11.2026
☒	Design-Spezifikation	06.11.2026
☒	Projektplan	13.11.2026
☐	Ausgewertete Google Forms Befragung zum Prototyp	15.11.2026
☐	Unterzeichneter Projekt- & Übergabevertrag	30.11.2026
☐	Frontend-Quellcode (HTML, CSS, JS)	10.12.2026
☐	Beta-Anwendung	10.12.2026
☐	Ausgewertete Google Forms Befragung zum Beta-Programm	20.12.2026
☐	Eingerichtetes Supabase Backend (PostgreSQL-Datenbank, Storage, Auth)	01.01.2027
☐	Ausgewertete SUS-Fragebögen	16.01.2027
☐	Live Demo für den Pitch	27.01.2027
☐	Freigeschaltete Web-App	12.02.2027
☐	Endbericht	26.02.2027

13. Gantt-Chart

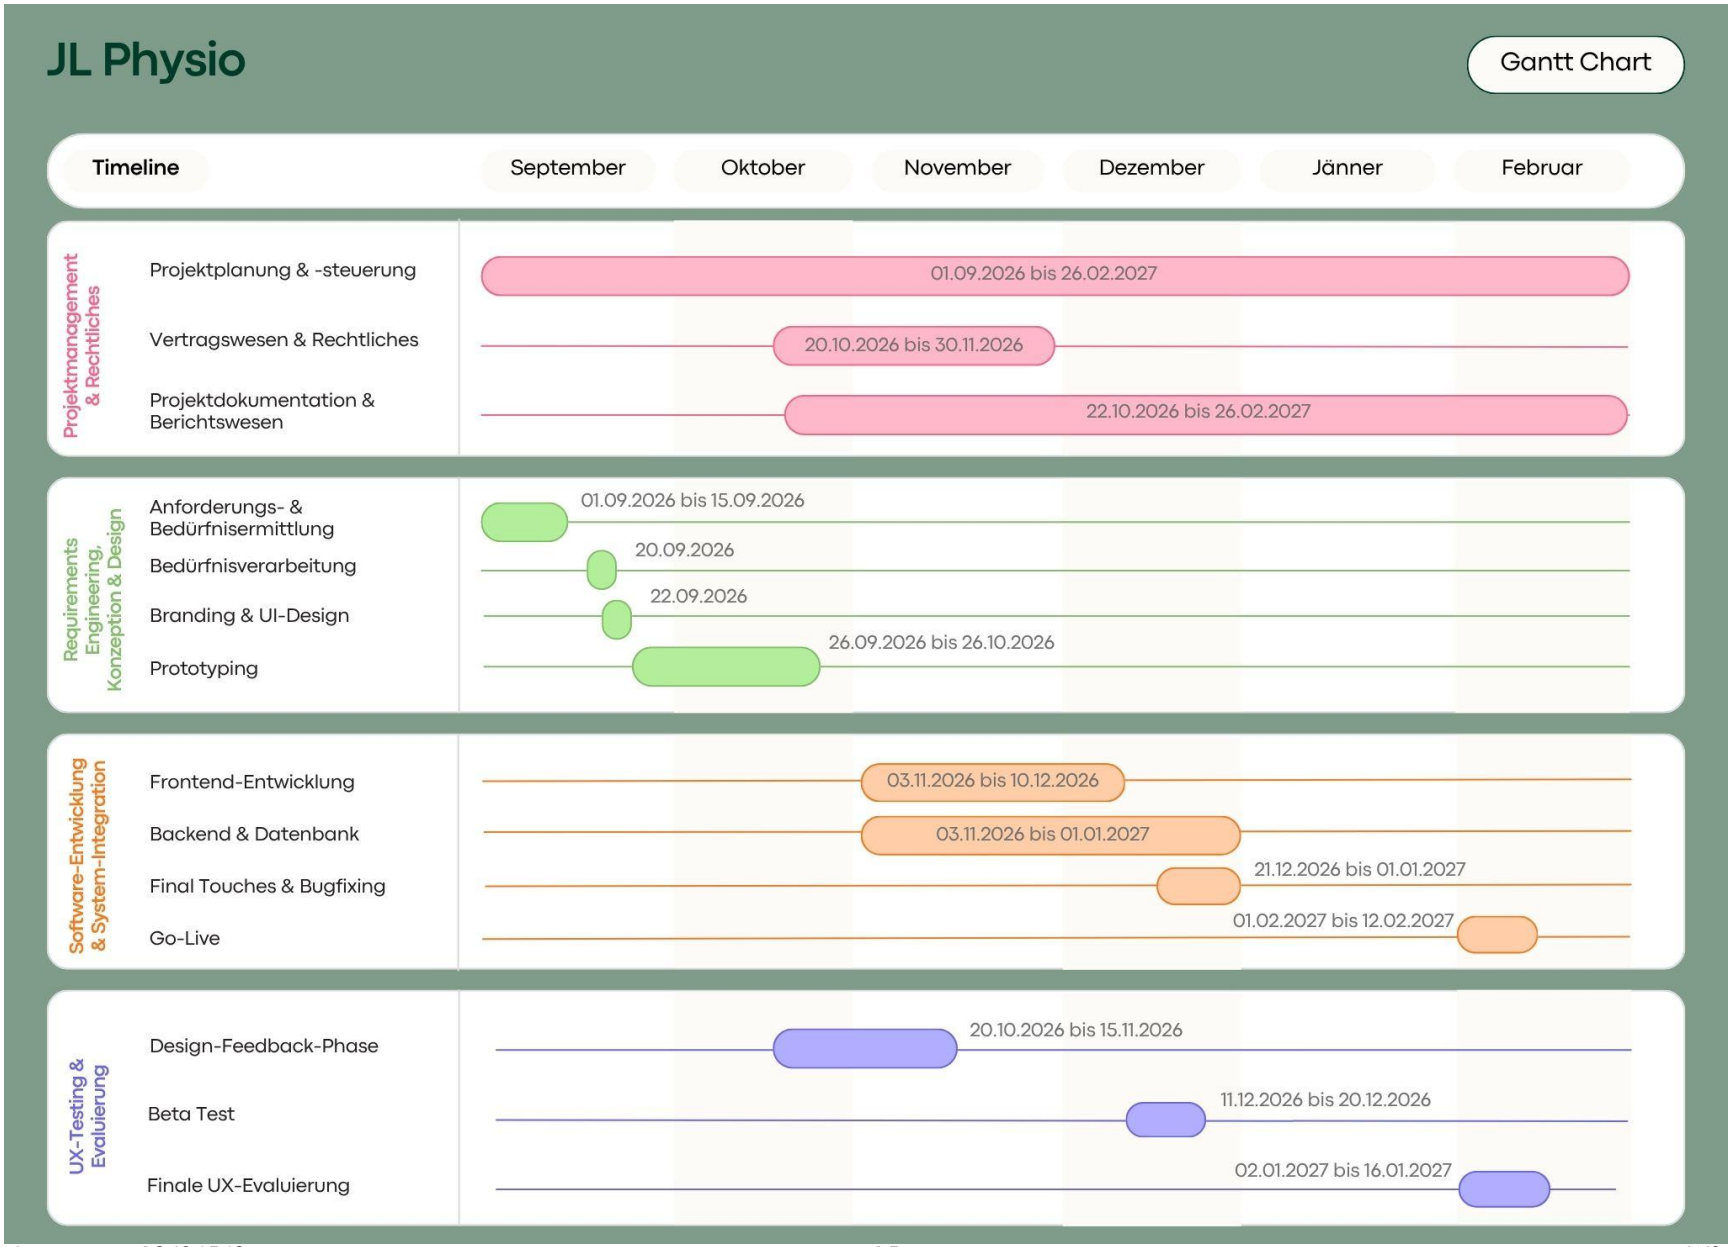

14. Risikoanalyse

	Risiko	Bewältigungsstrategie	Risikoausmaß
1	Verzögerungen im Zeitplan bei der Software-Entwicklung	Einplanung von zeitlichen Puffern, eindeutiger Fokus auf das MVP, Verzicht auf In-App-Feedback-Funktion	**Hoch**
2	Zeitstress für das Usability-Testing mit Patient:innen	Frühzeitige Terminabsprache und Information über die Therapeutin, ortsunabhängige und flexible Test-Methode (online via Google Forms)	**Mittel**
3	Ausfall oder Verzögerung bei der Rückmeldung der Auftraggeberin	Fixierte Termine für Feedback-Phasen rechtzeitig ankündigen und regelmäßige Abstimmung sicherstellen	**Mittel**
4	Krankheitsbedingter Ausfall der Auftragnehmerin während kritischer Entwicklungsphasen	Frühe Fertigstellung der Kernfunktionen und saubere Dokumentation der Fortschritte und ToDos	**Mittel**
5	Verzögerung durch Probleme bei der Einrichtung des Hostings (Netlify & IONOS)	Zeitgerechte Einrichtung der externen Dienstleistungen (Supabase, Netlify, IONOS) und intensive Recherchearbeit	**Gering**
6	Aufforderung zu neuen Features	Strenge Einhaltung des Projektumfangs und Vormerkung für Phase 2	**Mittel**
